Rail au sol et raccord B / R1 — façade contre le rebord intérieur

Vue depuis la cabane • Mesures en cm • Schéma de compréhension

Pied de T1 : B, R1 et plâtre translucide

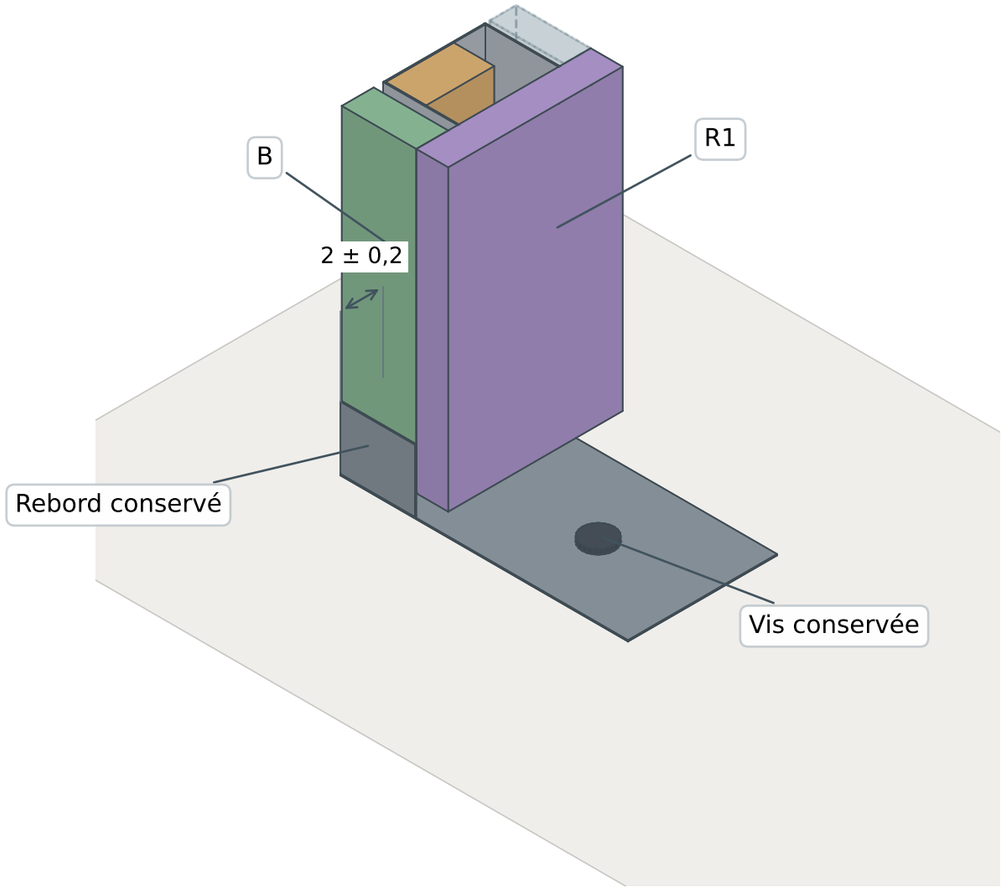

Plan du raccord : les retours couvrent le bord de la façade

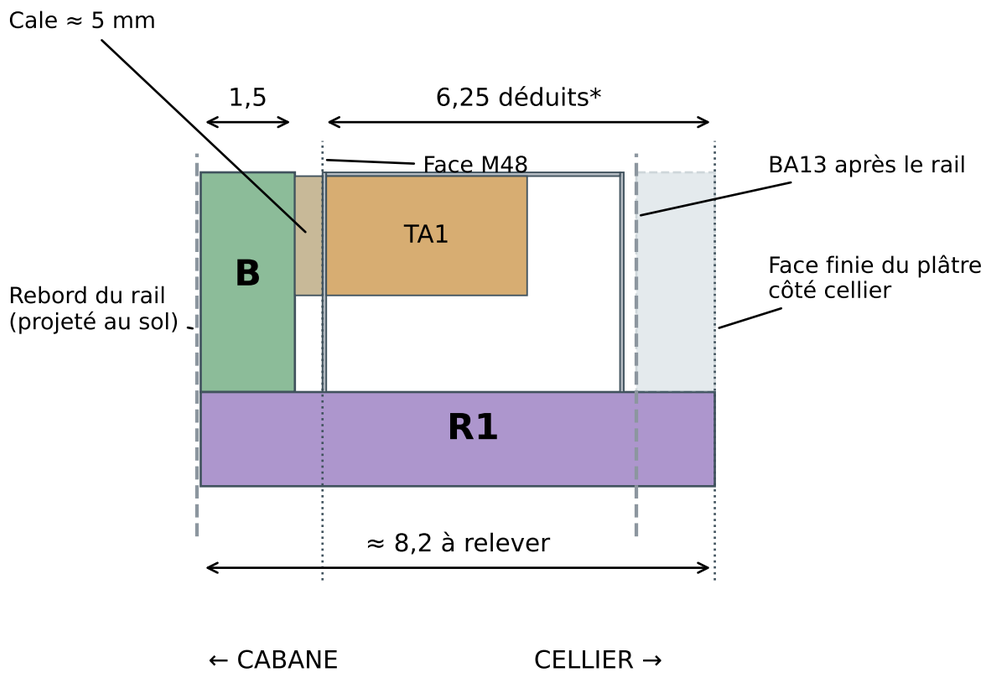

FAITS : profondeur M48 → plâtre 6 ± 0,2 cm ; rebord rail → M48 2 ± 0,2 cm ; rail large de 7 cm.

HYPOTHÈSE : OSB 1,5 cm contre le rebord intérieur ; cales ≈ 5 mm derrière. Fixation aux tasseaux, pas au rebord.

* BA13 confirmé 1,25 cm après le rail : 7 − 2 + 1,25 = 6,25 cm, contre 6 cm mesurés. Écart de 2,5 mm à contrôler.

À RELEVER : rebord intérieur → face finie du BA13 pour les retours (≈ 8,2 cm dessinés). Ailes 3 cm et tôle 0,6 mm supposées.

Le rebord reste visible devant le pied de B/A : finition basse à définir. Ailes retirées uniquement dans le passage : proposition.

Ce dessin ne valide ni les coupes finales ni les fixations. Aucun retrait de métal sous les montants n’est prescrit.
